



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Αρ. 30/2016

**« Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων – γραφείων νέου αμαξοστασίου
ΤΥ »**

Προϋπολογισμού: 13.999,60 Ευρώ (με ΦΠΑ)

ΚΑ: 20-7122.000

1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
6. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

**Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ»**

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 20-7122.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) μεταλλικών μονάδων ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του αμαξοστασίου του Δήμου μας.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διάγεια), του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) του Ν.3548/07 (Πρόγραμμα Διαφάνειας) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Έτους 2016 με **Κ.Α. 20-7122.000**.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα φτάσει το ποσό των **11.290,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 2.709,60€ σύνολο ποσού 13.999,60€**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα 28 / 12 /2016

**Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας**

**Σαλαμίνα, 28/12/16
Ο Συντάξας**

**ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)**

**ΒΟΣΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ(ΠΕ5)**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: **13.999,60 €** (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: **20-7122.000**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τύπος Α: Μονάδα οικίσκου χώρου γραφείων (δύο χώρων)

Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα αποτελείται από δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.

Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.

Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.

Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)

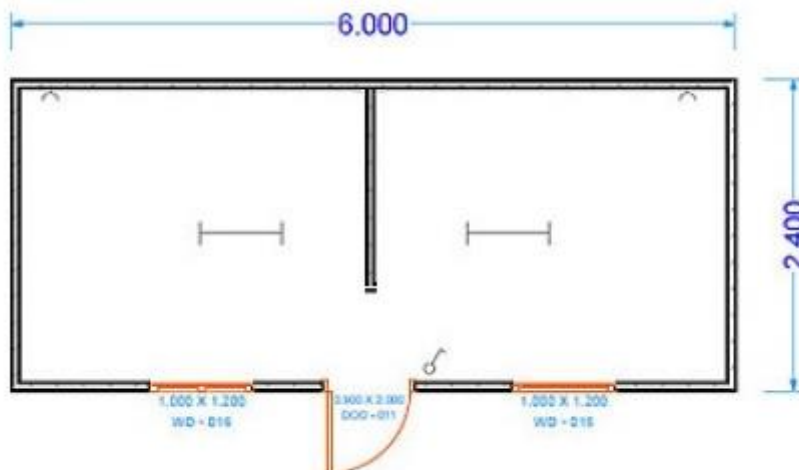

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από:

- Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.
- Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας
- Φωτιστικά σώματα φθορισμού
- Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)
- Ρελέ διαρροής

Τοίχοι: - Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.

Δάπεδο: 1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2) Πλακάκι θαλάσσης
3) Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα: Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.

Παράθυρο: Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί, περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα

Μόνωση - Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)

- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)

- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W


Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

- Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.
- Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

Τύπος Β: Μονάδα οικίσκου αποδυτηρίων (ενός χώρου)

- Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Β θα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο.
- Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.
- Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.

Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)

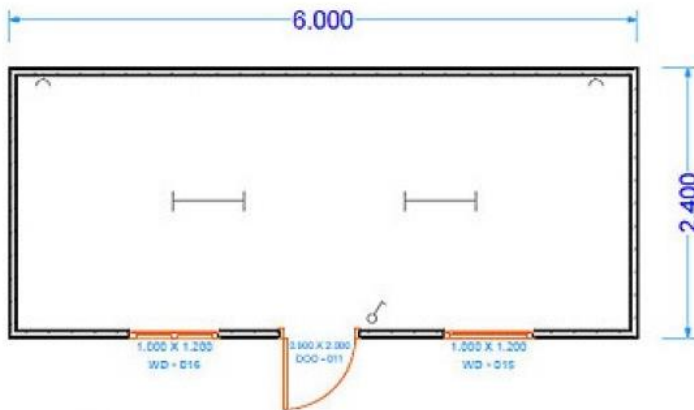

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από:

- Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.
- Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας
- Φωτιστικά σώματα φθορισμού
- Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)
- Ρελέ διαρροής

Τοίχοι: - Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.

Δάπεδο: 1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
2) Πλακάζ θαλάσσης
3) Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα: Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.

Παράθυρο: Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί, περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα

Μόνωση - Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)

- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)

- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W

Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

- Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.
- Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και αμεταχείριστοι.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας καθ' υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση ενός έτους.
- Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα, 28/ 12/2016

**Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας**

Σαλαμίνα, 28/12/2016

Ο συντάξας

**ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)**

**ΒΟΣΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΠΕ5)**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

**Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »**

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 20-7122.000

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την: **«Προμήθεια προκατασκευασμένων αποδυτηρίων – γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ»**

Η εν λόγω προμήθεια εργαλείων θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Δήμου για εύρυθμη και έγκαιρη διαχείριση των απορριμμάτων στην διοικητική του περιφέρεια.

Άρθρο 2^ο

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

1. Την Τεχνική Έκθεση
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Την Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς
5. Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
6. Τον Προϋπολογισμό Προσφοράς

Άρθρο 3^ο

Η διενέργεια και η πραγματοποίηση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις Ν.4412/2016 άρθρο 118 ,του Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του Ν.3548/07(Πρόγραμμα Διαύγεια). Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον ψηφισμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 με **Κ.Α. 20-7122.000**

Άρθρο 4°

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος , υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι 20 ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 5°

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί εντός δύο (02) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Ο Δήμος πάντως διατηρεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών.

Στον προμηθευτή, που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται από τον Ν.4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται οριστική παραλαβή της προμήθειας μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων.

Άρθρο 6°

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των ειδών για έλεγχο ποιότητας και προδιαγραφών στο χημείο του κράτους ή σε άλλα εγκεκριμένα ιδρύματα.
Σε περίπτωση που τα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί , ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει το υστερούντα είδη με άλλα που καλύπτουν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Άρθρο 7°

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών στο Δήμο στις ποσότητες ώστε να καλύψουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων (μεταφορέων κ.λ.π.) μέχρι την παράδοση των ειδών.

Άρθρο 8°

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και το κόστος μεταφοράς των ειδών .

Άρθρο 9°

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Για την Ελλάδα είναι το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Εγκ. Υπ. Ες.27874/8-6-93). Το εν λόγω πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία συμμετοχής στην απ' ευθείας ανάθεση.
Η πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται από τον Ν.4412/2016.

Άρθρο 10°

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει **με απόφαση Δημάρχου**, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 118 παρ. 2, στην χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Άρθρο 11°

Η τιμή πώλησης των ειδών θα επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων φόρων. Επίσης με βάση το άρθρο 24 του Ν.2198/22-3-94 κατά την προμήθεια θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος τέσσερα τοις εκατό (4%) στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα, 28/12/2016

Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,

Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα, 28/12/2016

Ο συντάξας

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΤΕ)

ΒΟΣΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΠΕ5)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 20-7122.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Τύπος Α: Μονάδα οικίσκου χώρου γραφείων (δύο χώρων)

Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα αποτελείται από δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.

Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.

Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.

Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)

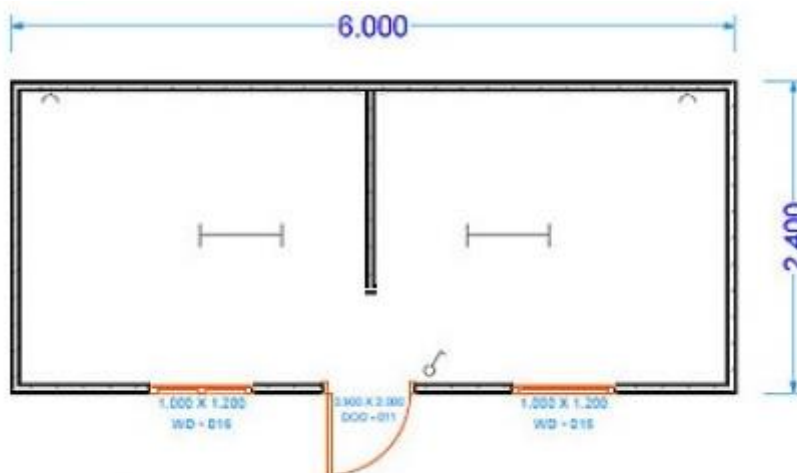

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από:

- Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.
- Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας
- Φωτιστικά σώματα φθορισμού
- Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)
- Ρελέ διαρροής

Τοίχοι: - Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.

Δάπεδο: 1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ

2)Πλακάς θαλάσσης

3)Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα: Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.

Παράθυρο: Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί, περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα

Μόνωση - Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλυψης με πολυουρεθάνη

- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)

- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)

- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W

Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:


- Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.
- Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

Τύπος Β: Μονάδα οικίσκου αποδυτηρίων (ενός χώρου)

- Η μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον Δήμο Σαλαμίνας . Ο τύπος Α θα αποτελείται από δύο επί μέρους χώρους με εσωτερικό χώρισμα.

- Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής.
- Η θέση της εγκατάστασής της μονάδας μέσα στο χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας θα ορίζεται από τον Δήμο Σαλαμίνας.

Διαστάσεις εξωτερικές: 6000 x 2400 x 2550 mm (M x Π x Υ)

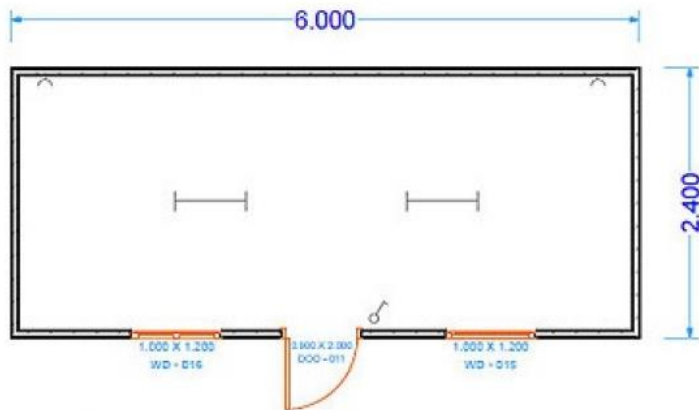

Περιγραφή: Στιβαρή αυτόνομη- αυτομεταφερόμενη κατασκευή από χαλυβδοελάσματα ειδικά διαμορφωμένα και μορφοδοκούς πάνω στους οποίους επενδύονται τα πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης. Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς με ανυψωτικό μηχάνημα ή γερανό.

Βασικός εξοπλισμός: Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από:

- Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες.
- Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας
- Φωτιστικά σώματα φθορισμού
- Διακόπτες, πρίζες σούκο (στεγανού τύπου)
- Ρελέ διαρροής

Τοίχοι: - Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης

Διαχωριστικό χώρισμα από πάνελ πολυουρεθάνης εσωτερικά του οικίσκου.

- Δάπεδο:**
- 1) Λαμαρίνα γαλβανιζέ
 - 2) Πλακάς θαλάσσης
 - 3) Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης ή laminate

Πόρτα: Αλουμινίου με επιφάνειες από θερμομονωτικά πάνελ αλουμινίου επίπεδα, με τρεις μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας.

Παράθυρο: Δύο επάλληλα αλουμινίου με διπλά θερμομονωτικά τζάμια, μονωτικό γυαλί, περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα

Μόνωση - Τοίχοι: 40 mm πάνελ πλαγιοκάλλυψης με πολυουρεθάνη
- Οροφή: 50 mm πάνελ επικάλλυψης, με πολυουρεθάνη

Ηλεκτρική εγκατάσταση: πρίζα, 380 V / 32 A (εξωτερικά)

- 230 V πρίζες, διακόπτες (εσωτερικά)

- Λάμπα φθορίου (μακρόστενη), 36 W

Θέρμανση και κλιματιστική εγκατάσταση:

- Air condition, split, ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένα.
- Περιλαμβάνει εξωτερικά των παραθύρων προστατευτικά κάγκελα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και αμεταχείριστοι.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σαλαμίνας καθ' υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
- Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση ενός έτους.
- Οι προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

.....(τόπος) , .../...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: **13.999,60 €** (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: **20-7122.000**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
1	Μεταλλικοί οικίσκος γραφείων (δύο χώρων με εσωτερικό χώρισμα) ελαφριάς προκατασκευής, εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)	ΤΕΜ.	1	6.000,00€	6.000,00€
2	Μεταλλικοί οικίσκος αποδυτηρίων(ενός χώρου) ελαφριάς προκατασκευής, εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)	ΤΕΜ.	1	5.290,00	5.290,00€
				ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	11.290,00€
				ΦΠΑ 24%	2709,60€
0				ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	13.999,60€

*Οι τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο εμπόριο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα, 28/12/2016

Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Σαλαμίνα, 28/12/2016
Ο συντάξας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016

Τίτλος: « Προμήθεια
προκατασκευασμένων αποδυτηρίων –
γραφείων νέου αμαξοστασίου ΤΥ »

Προϋπ/σμός: 13.999,60 € (με ΦΠΑ)

Κ.Α.: 20-7122.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
1	Μεταλλικοί οικίσκος γραφείων (δυο χώρων με εσωτερικό χώρισμα) ελαφριάς προκατασκευής, εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)	ΤΕΜ.	1	6.000,00€	6.000,00€
2	Μεταλλικοί οικίσκος αποδυτηρίων(ενός χώρου) ελαφριάς προκατασκευής, εξωτερικών διαστάσεων: 6000 x 2400 x 2550 mm (Μ x Π x Υ)	ΤΕΜ.	1	5.290,00	5.290,00€
				ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	11.290,00€
				ΦΠΑ 24%	2709,60€
				ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	13.999,60€

.....(τόπος), / / 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
